


第75号議案関係資料 オリンピック・パラリンピック施設周辺道路整備等工事について

■案内図

オリンピック・パラリンピック施設
周辺道路整備工事(その1)

勝島歩道橋南側
エレベーター設置工事委託

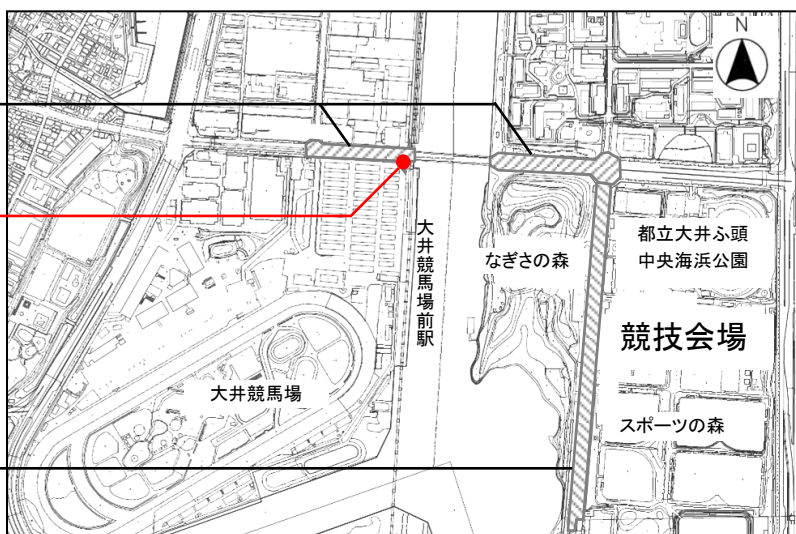

オリンピック・パラリンピック施設
周辺道路整備工事(その2)

■道路整備工事の概要

○その1の概要

- 1 整備延長 約400m
- 2 工期 平成30年7月12日から令和元年6月28日まで(整備済)
- 3 主な工種 舗装工、安全施設工、区画線工など

○その2の概要

- 1 整備延長 約630m
- 2 工期 平成30年7月12日から令和2年1月6日まで
- 3 主な工種 舗装工、安全施設工、区画線工など


■工程表

年度	平成30年度	令和元年度(平成31年度)
勝島歩道橋南側 エレベーター設置工事委託	7/11契約 12/27	
オリンピック・パラリンピック施設周辺 道路整備工事(その1)	7/11契約 6/28	【整備済】
オリンピック・パラリンピック施設周辺 道路整備工事(その2)	7/11契約 1/6	
遮熱性舗装工事		9月 中旬 3月 上旬

■勝島歩道橋南側エレベーター設置工事の概要

- 1 工期 平成30年7月11日から令和元年12月27日まで
- 2 主な工種 エレベーター設置工、付帯工など
- 3 予算 272,467千円
(内訳) 平成30年度 18,111千円
令和元年度(平成31年度) 254,356千円
補正予算 130,082千円
補正の理由 近隣施設との調整により、工事内容を一部変更したため
- 4 工事の状況

《エレベーター設置個所平面図》

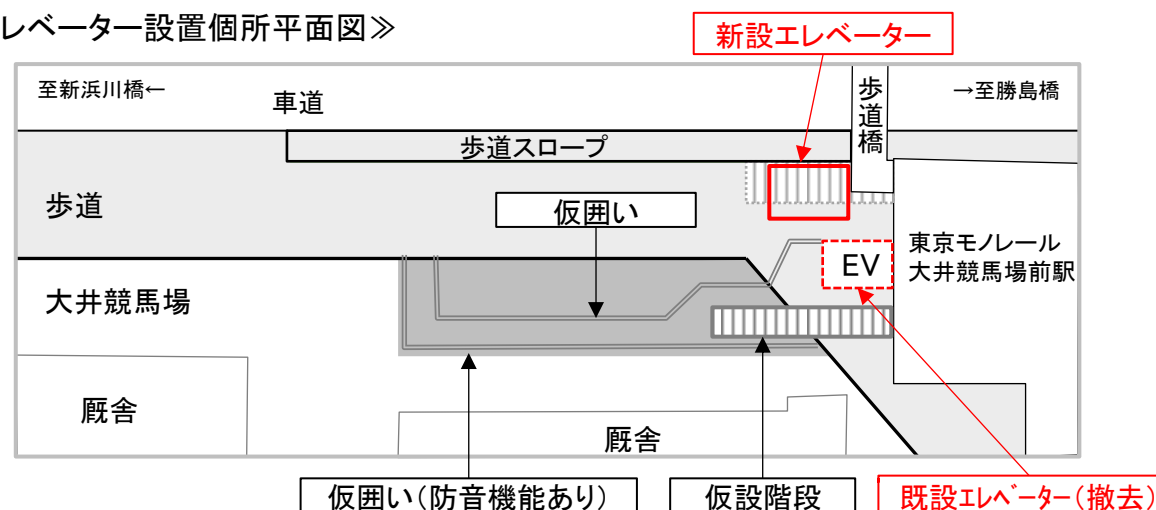

勝島歩道橋



仮設階段

仮囲い
(防音機能あり)

仮囲い


令和元年9月1日時点
現況写真

第75号議案関係資料

都市計画道路補助163号線整備に伴う大井町線橋梁架替工事について

1. 進捗状況

平成27年度より進めてきた東急大井町線橋梁架替工事は、令和元年8月に本体の架替工程が完了し、令和2年3月には全体工程が完了予定である。

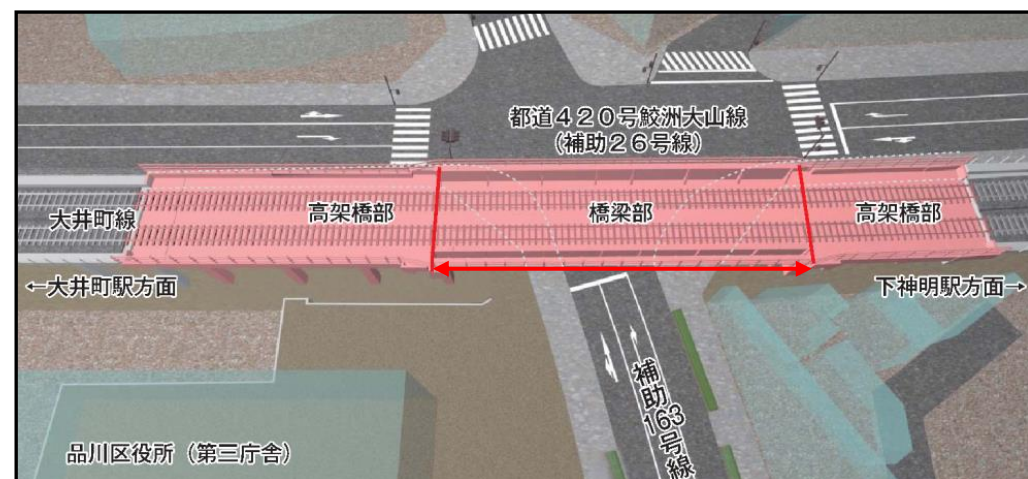


2. 補正予算について

高架橋基礎杭の施工において、地中深い箇所（地上部から約20m）で想定外の支障物が出たことにより撤去工事等を実施したことで工事費増となった。

【令和元年度予算】：1,683,220千円


【補正予算額】：151,000千円

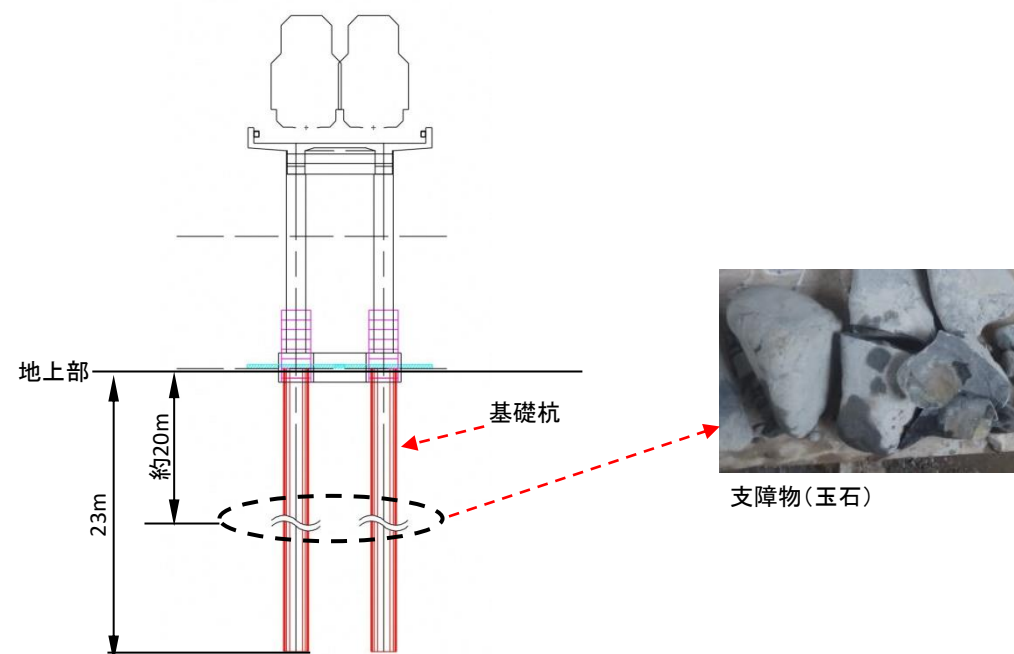

3. 今後について

令和2年3月完了に向けて、仮設材および既設橋台の撤去等の工事を実施する。この際、歩道部をフェンスで囲って工事を行うため、大井町駅側高架橋部下に仮歩道を設ける。

仮歩道設置期間：令和元年10月31日夜間～令和2年3月末の予定

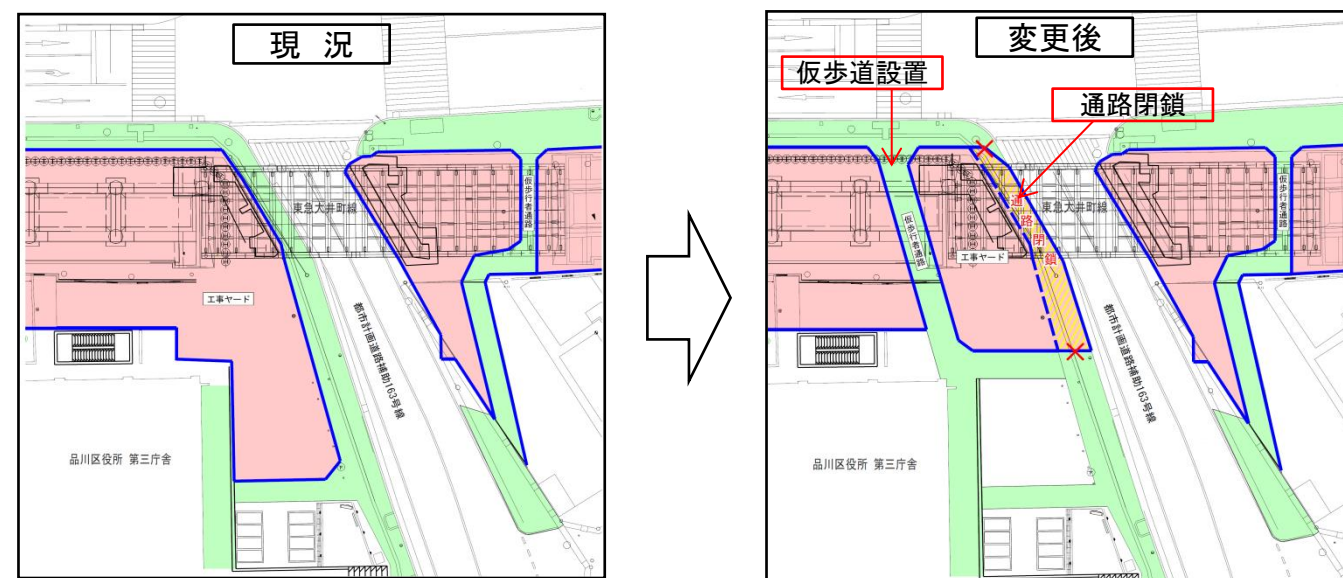

4. 完成イメージ

