


旧国家公務員宿舎小山台住宅等解体工事の進捗状況について

1. 現状

財務省が、令和元年度に実施予定であった小山台住宅5号棟・6号棟・峰友寮の解体工事について、アスベスト調査の結果延期することを決定した。

2. 国家公務員宿舎の配置と活用案

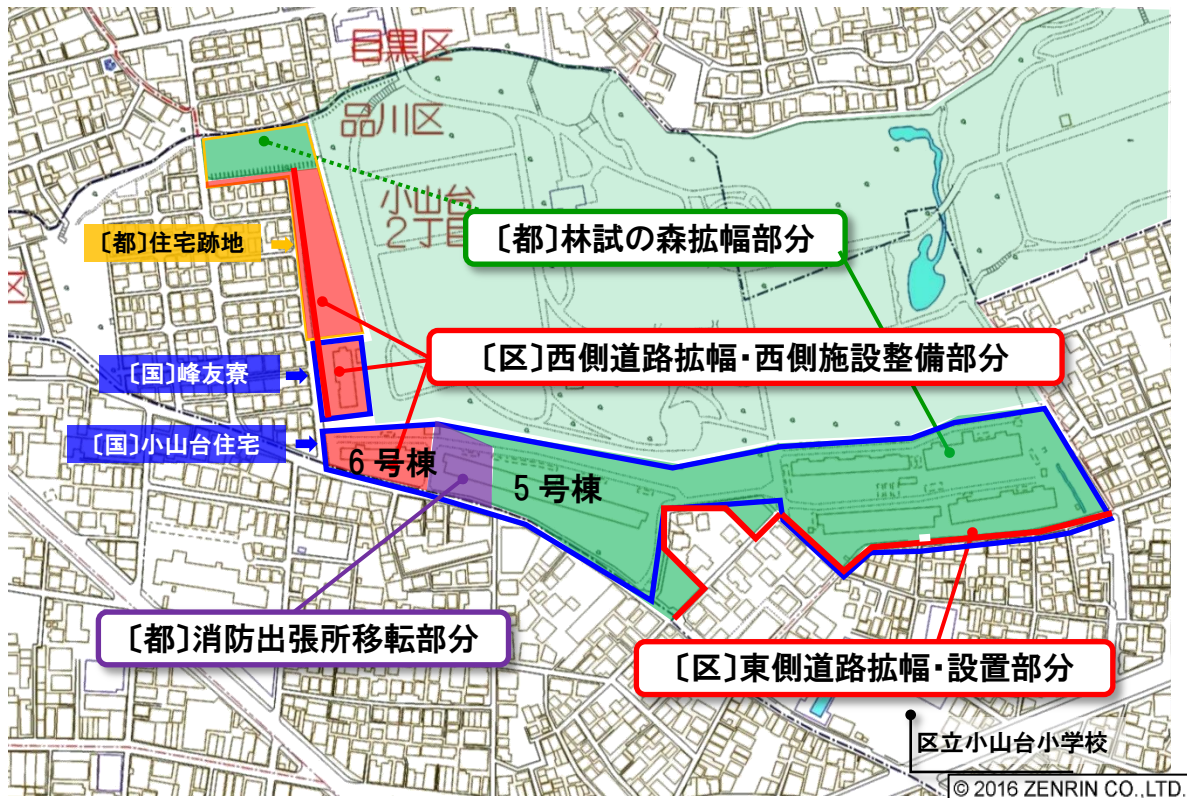

3. 当初想定スケジュールと現在の検討状況

	当初想定	現在の検討状況
・財務省による解体工事	令和元年度中	⇒ 延期（実施時期未定）
・品川区西側道路整備	令和3年度から	⇒ 早期実施に向け調整中
・品川区施設整備	令和4年度から	⇒ 解体後の早期着手に向け調整中
・品川区東側道路整備	令和4年度から	⇒ 早期実施に向け調整中

4. 今後について

国に対し解体工事の早期実施を要望するとともに、各関係機関と協議を行い、早期事業着手に向けて進めていく。

5. その他（東京都公園審議会の進捗状況および今後の予定）

令和元年12月23日	公園審議会 中間まとめ
12月26日～令和2年1月25日	パブリックコメント 意見照会
令和2年1月中旬～下旬	地域・利用団体との意見交換会
3月	答申
