


## 立会川幹線雨水放流管工事（東京都下水道局施工）について

### 1 立会川幹線雨水放流管工事の概要

立会川沿いで発生する浸水被害の軽減および立会川（勝島運河）の水質改善を図るため、立会川の地下（なぎさ会館～月見橋）に立会川幹線雨水放流管を整備する。

雨水放流管完成後は、高潮・津波対策として、河口に樋門・排水機場を整備する計画である。

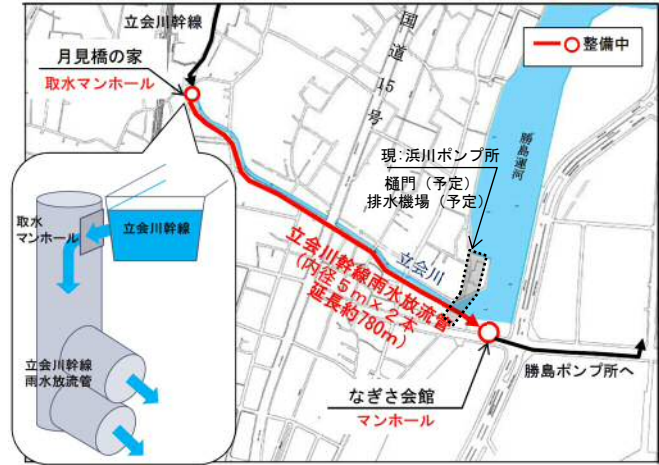

### 2 工事工程の変更

トンネル施工時のトラブル、将来施工する「月見橋の家」の仕様・構造の変更に伴う到達防護工の見直しによる補助工法の追加、および現工事の実態を踏まえた施工方法の見直しによる施工能率の低下に伴い、工事工程を変更する。


- 立会川幹線雨水放流管の通水開始時期

現在の予定：令和3年度末 ⇒ 変更後：令和9年中頃

- 月見橋の家の復旧工事完了時期

現在の予定：令和4年度末 ⇒ 変更後：令和10年度末

なお、令和4年中頃に浜川ポンプ所の流域切替を行うことで、雨天時において、浜川ポンプ所から勝島運河への放流がなくなり、水質が改善される。

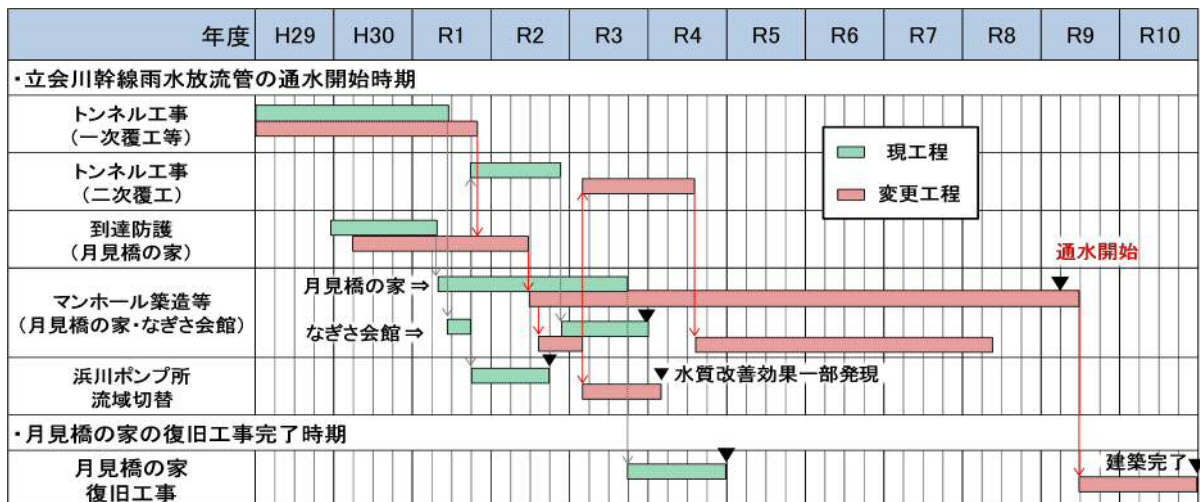

### 3 今後の予定

町会や周辺区民、月見橋の家関係者に対する工程変更の説明については、都と連携し丁寧な説明を実施する。また、事業完了まで工程管理の徹底および早期の事業完成を都に強く要請していく。
