


電線共同溝等工事（競馬場通り）の委託変更について

1. 概要

競馬場通りでは、東京電力パワーグリッド(株)が所有する設備の一部を活用した無電柱化を実施しており、区、東京電力パワーグリッド(株)および東電タウンプランニング(株)の3者で令和2年7月に基本協定を締結し、電線共同溝等の設計・工事および企業者調整を行っている。今般、これまでの設計、現地での試掘および労務単価の上昇を踏まえ、費用および協定期間を以下のとおり変更する。

なお、令和7年四定にて債務負担行為を設定した。

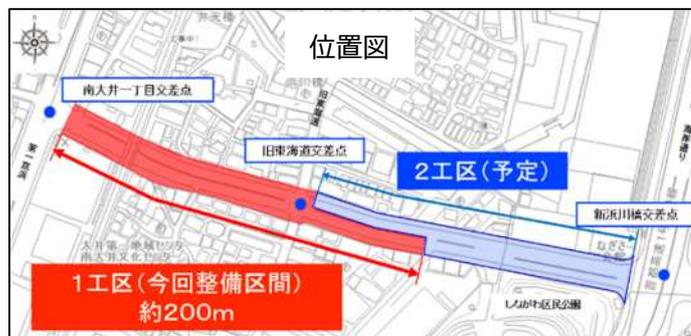

2. 変更概要（協定名：譲渡設備を活用した電線共同溝整備）

①委託協定期間の変更

現協定期間：令和4年度～令和7年度

変更後協定期間：令和4年度～令和9年度（2年延伸）

（1）埋設物の支障による設計の見直し（1年延伸）

（2）働き方改革等による施工計画の見直しに伴う延伸（1年延伸）

②委託費の全体金額を変更する。

現協定額：401,198,997円

変更後協定額：617,393,289円（216,194,292円増）

（1）労務単価および資材単価の上昇による増額（約1.2億円増）

（2）交通誘導員の増員による増額（約0.6億円増）

（3）設計および試掘調査の増加に伴う増額（約0.4億円増）

3. 整備スケジュール(予定)

令和8年度 電線共同溝工事（本協定）

令和9年度 引連工事（電力）（本協定）

令和10年度 引連工事（通信）（NTT協定）

令和11年度 道路整備
